

神戸経済同友会の森

平成24年度 森林整備 報告書

平成25年 3月1日

兵庫県森林組合連合会

1. 作業概要

人工林間伐 100 本。

(ボランティアで伐採できない急斜面の太いスギ・ヒノキの間伐)

伐採木は土留めにして土砂の流出を防ぎます。

ボランティア活動地の危険な倒木の処理。

道沿いなどに土留の設置。

防腐剤を注入した木杭(10年間は腐らない)を60本使用。

倒木の処理・間伐 10 本。

架かったままの倒木を処理し、安全に森づくりや散策ができるようにします。

スギを間伐して明るくし、多様な植生を保ちます。

ササ刈払い。


登山道沿いの景観を良くし、モミジやサクラが楽しめる区域にします。

ヤブの手入れ(管理通路をつくって、常緑樹やササの伐採をしていきます。)

道沿いの整理・伐採

道沿いの枯れ枝を整理して安全に通行できるようにし、景観を良くします。

山田町下谷上

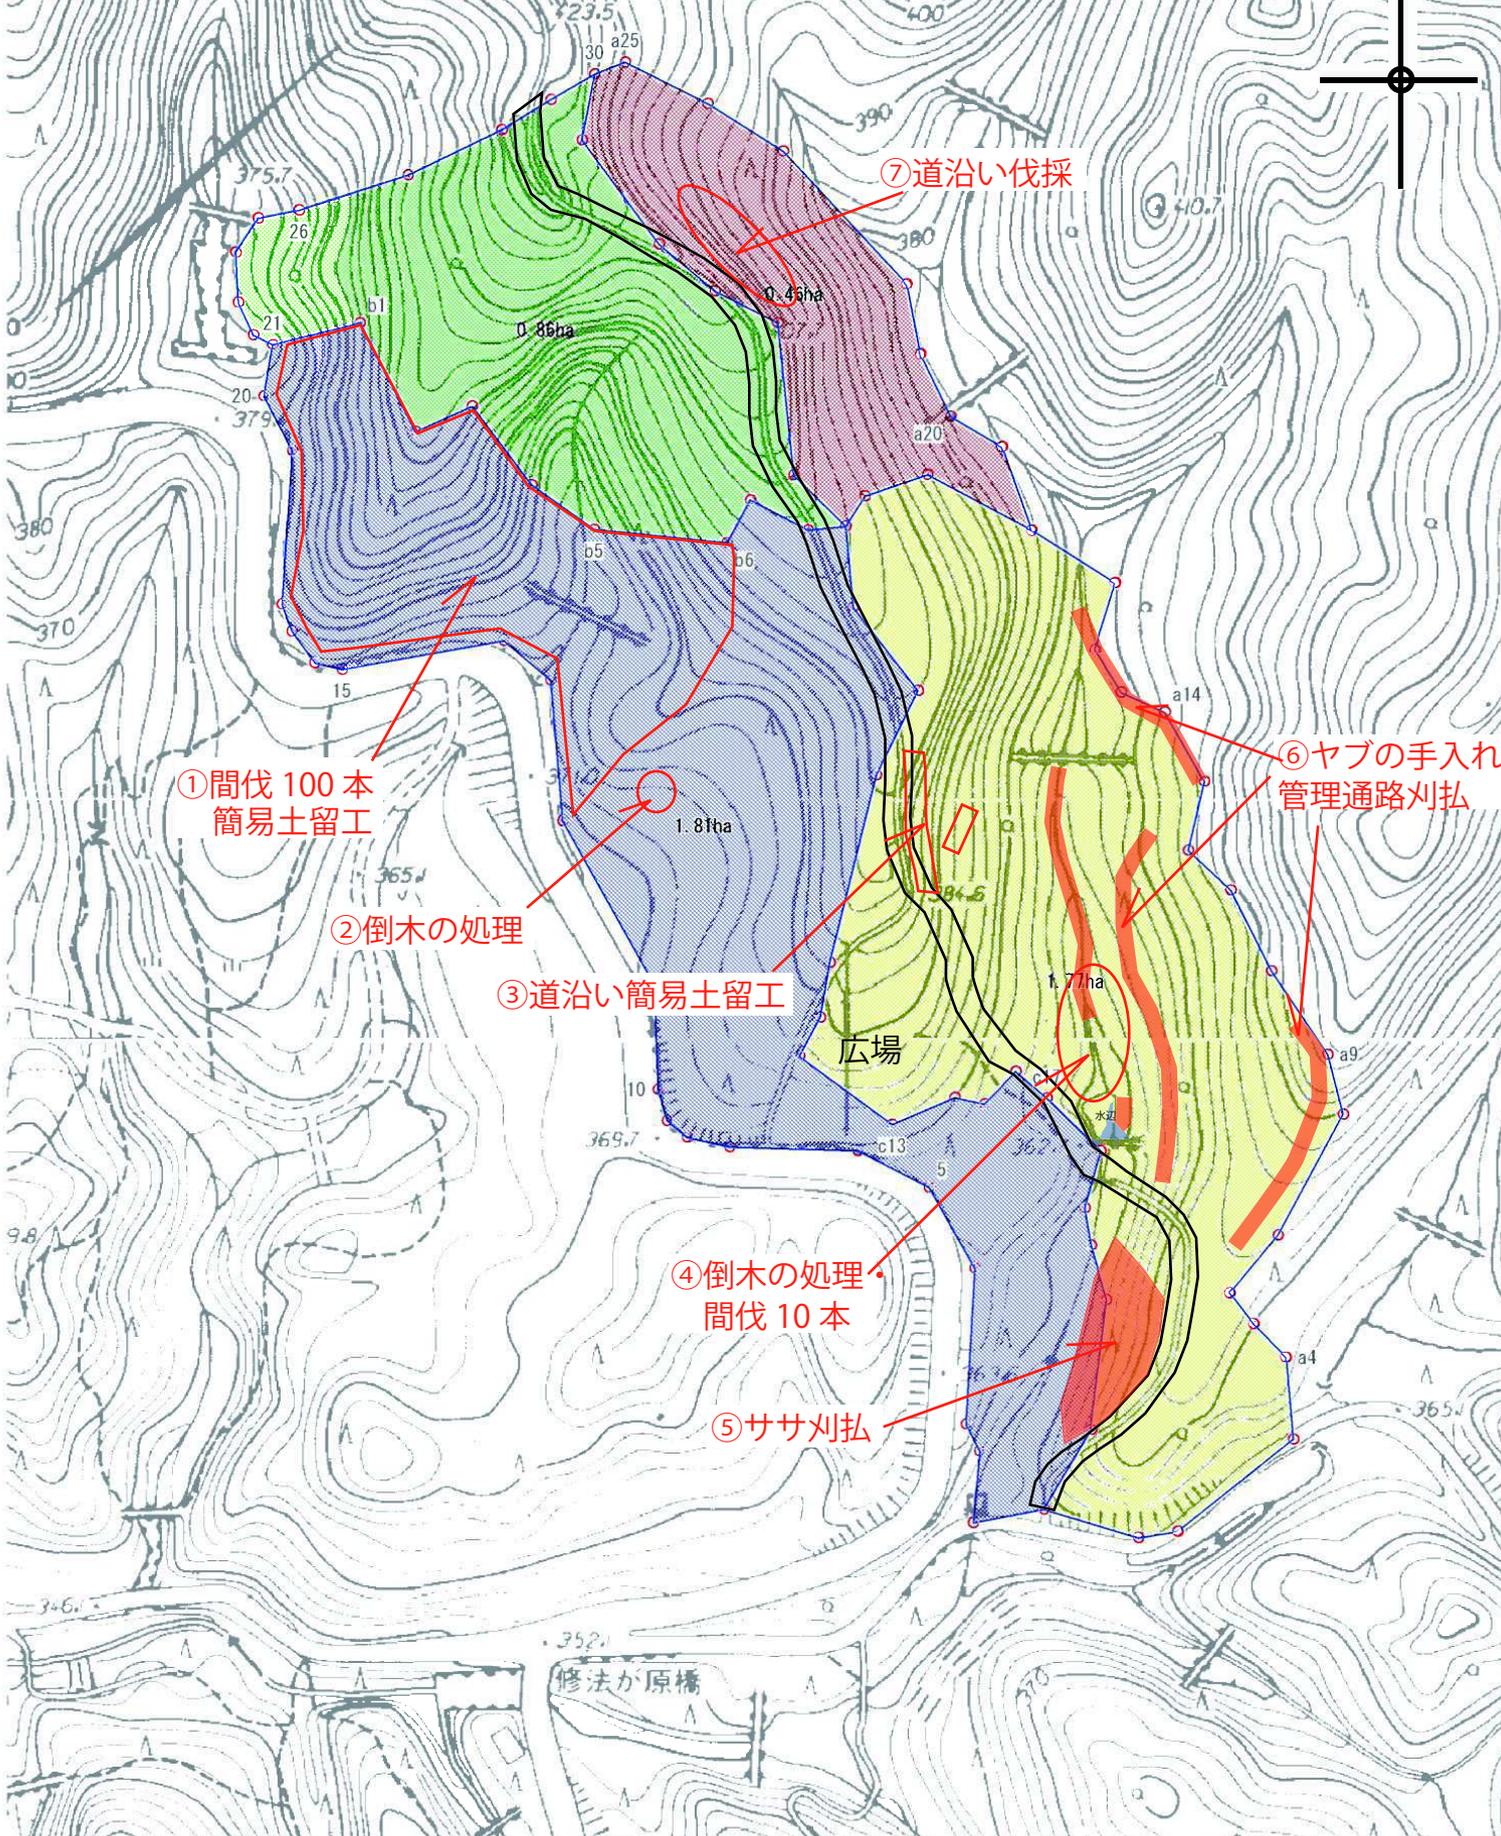

①間伐 100 本
簡易土留工

②倒木の処理

③道沿い簡易土留工

④倒木の処理
間伐 10 本

⑤ササ刈払

⑦道沿い伐採

⑥ヤブの手入れ
管理通路刈払

神戸経済同友会の森
平成 24 年度 整備箇所図

